

2023 年度全国注册征询工程师(投资)执业资格考试试卷

一、单项选择题(共 60 题, 每题 1 分。每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意)

1. 每个工程项目均有确定的起点和终点, 这是指工程项目的( )特性。

A. 唯一性

B. 一次性

C. 目的性

D. 同一性

2. 工程项目准备阶段的工作不包括( )。

A. 进行可行性研究

B. 编制项目概算

C. 进行工程设计

D. 签订承包协议

3. 国际原则化组织与国际征询工程师联合会均推荐采用的项目过程管理措施是( )。

A. 计划-实行-检查-处理

B. 计划-指挥-监督-检查

C. 指挥-监督-运转-协调

D. 计划-沟通-指挥-协调

4. 实行核准制的工程项目, 项目业主应做的工作重要包括: ①向建设主管部门申请办理  
动工手续;②向规划和国土主管部门申请办理规划和用地手续;③向规划和国土主管部门申  
请办理规划用地预审;④向发展改革部门申请核准项目申请汇报。已确定的实行次序是( )。

A.①-②-③-④

B.④-③-②-①

C.③-②-④-①

D.③-④-②-①

5.某地方政府投资项目的总投资为 6000 万元，其中中央预算内投资补助 3100 万元。该项目的( )应由国家发展和改革委员会审批。

A.项目建议书

B.可行性研究汇报

C.技术设计方案

D.竣工验收汇报

6.总投资 4000 万美元的限制类外商投资项目应由( )核准。

A.地级发展改革部门

B.地级人民政府

C.省级发展改革部门

D.县级人民政府

7.有关中央政府对特定领域项目予以投资补助或贷款贴息的说法，对的是( )。

A.项目如享有投资补助应偿还利息

B.项目不能同步享有投资补助和利息补助

C.项目可按同意的贴息额度直接领取建设资金

D.在贴息额度内，项目按实际使用贷款产生利息的数额享有补助

8.某地方企业拟投资 28000 万美元在境外开发资源，该项目应由( )核准。

A.县级发展改革部门

B.国家发展和改革委员会

C.省级发展改革部门

D.地级发展改革部门

9.根据《规划环境影响评价条例》，有关部门编制的综合性规划应包括( )。

A.环境影响篇章或阐明

B.环境影响汇报书

C.环境影响汇报表

D.环境影响登记表

10.工程项目竣工验收申请汇报的提交方是( )。

A.项目业主

B.征询工程师

C.工程承包商

D.项目使用人

11.根据《项目申请汇报通用文本》，拟建项目对风景名胜的影响分析属于( )。

A.生态环境保护措施分析

B.生态环境影响分析

C.地质灾害影响分析

D.特殊环境的影响分析

12.征询项目委托方对征询任务的规定一般体现在( )中。

- A.工作分解构造
- B.项目建议书
- C.项目工作大纲
- D.招标邀请书

13.制定工程项目综合管理计划的环节重要包括:①将项目范围分为各工作包;②定义工程项目目的;③安排资源供应计划和费用控制计划;④安排协调一致的进度计划。对的的实行次序是( )。

- A.①-②-③-④
- B.②-①-③-④
- C.①-②-④-③
- D.②-①-④-③

14.用赢得值法进行费用、进度的综合分析时,需要的基本参数不包括( )。

- A.计划工作预算费用
- B.已竣工作实际费用
- C.已竣工作预算费用
- D.所有工作结算费用

15.用赢得值法进行费用、进度综合分析时,若进度偏差不小于0,则工程项目绩效评价的结论是( )。

- A.进度比计划滞后

B.进度按计划进行

C.进度比计划提前

D.无法判断目前绩效

16.有关工程项目沟通管理的说法，错误的是( )。

A.沟通是工程项目管理的重要内容

B.沟通会因多种干扰形成沟通障碍

C.沟通按沟通范围可分为内部沟通和外部沟通

D.沟通按信息流向可分为双向沟通和单向沟通

17.工程项目范围管理的内容不包括( )。

A.范围界定

B.范围确认

C.范围控制

D.范围评估

18.工程项目范围确认是( )的过程。

A.委托方重新定义可交付成果

B.各有关方研究确定交付成果

C.委托方正式接受可交付成果

D.协议双方约定可交付成果

19.下列项目有关方中，不能对工程项目工程范围提出变更祈求的是( )。

A.项目贷款方

B.项目承包商

C.征询工程师

D.项目业主

20.根据世界银行征询服务协议原则文本,复杂的征询服务采购一般采用( )方式。

A.总价计价

B.基于时间计价

C.单价计价

D.成本加酬金计价

21.一般状况下,最高层管理人员和基层管理人员的管理幅度分别以( )为宜。

A.3~5人和8~10人

B.4~8人和8~15人

C.3~5人和6~8人

D.2~5人和5~7人

22.某企业为减少组织运行成本,应采用( )的措施。

A.减少管理幅度、增长管理层次

B.减少管理层次、增长管理幅度

C.增长管理幅度、增长管理层次

D.减少管理层次、减少管理幅度

23.一般状况下,工程项目管理组织体系包括项目的( )两个子系统。

A.内部和外部

B.目的和任务

C.过程和成果

D.直接管理和服务支持

24.矩阵式组织构造的缺陷不包括( )。

A.项目管理权力平衡协调任务重

B.项目组员将接受多头领导

C.信息回路比较复杂

D.团体工作目的不明确

25.为使团体组员对其工作有明确的理解和把握,应对工作进行必要的阐明,这在项目人力资源管理中称为( )。

A.角色和职责安排

B.人员配置计划

C.人际关系界面

D.工作描述

26.可以清晰反应团体组员与项目有关的所有活动和同每项活动有关的所有人员的管理工具是( )。

A.组织分解构造图

B.责任分派矩阵

C.资源分解构造图

D.角色—职责—职权表

27.对工程项目团体完毕工作的进度与费用进行跟踪检查时,常用的管理工具是( )。

- A.直方图与决策树
- B.横道图与网络图
- C.网络图与鱼刺图
- D.横道图与决策树

28.在编制工程项目技术提议书时就确定了项目团体的部分人员,这种吸纳人员的方式称为( )。

- A.内部招聘
- B.外部招聘
- C.商谈
- D.预安排

29.评标时按事先公布的原则对所有投标文献进行评审,这属于招标投标规定遵照的( )原则。

- A.公开
- B.公正
- C.公平
- D.诚实信用

30.有关招标代理机构的说法,错误的是( )。

- A.招标代理机构与国家机关不得存在利益关系
- B.招标代理机构必须具有对应的招标代理资格



C.招标代理机构专家库人员不能进入项目评标委员会

D.未经招标人同意不得转让招标代理业务

31.根据《工程建设项目招标范围和规模原则规定》，( )不属于使用国际组织或外国政府资金的项目。

A.使用国家对外借款的项目

B.使用外国政府贷款项目

C.使用国际组织援助资金的项目

D.使用世界银行贷款的项目

32.按照货品招标的一般规定，货品招标文件中“投标人须知”的内容应包括( )。

A.协议重要条款

B.投标文件格式

C.报价有效期

D.评标原则和措施

33.协议任何一方不得把自己的意愿强加于另一方，这是协议管理的( )原则的规定。

A.诚实信用

B.平等自愿

C.等价有偿

D.公平公正

34.有关 FIDIC 施工协议条件中协议担保的说法，对的是( )。

A.承包商接受预付款前可以不提供预付款担保

履约保函为无条件担保形式

C.履约保函有效期到工程师颁发工程接受证书时为止

D.通用条件中明确规定了 5 种业主可凭履约保函索赔的情形

35.有关 FIDIC 指定分包商的说法,对的是( )。

A.指定分包商可由工程师选定

B.指定分包商应与业主签订协议

C.指定分包商不能提供工程技术服务

D.承包商不负责指定分包商的监管

36.根据《原则施工招标文献》(2023年版),协议文献重要包括:①投标函及附录;②协

议协议书;③中标告知书;④通用协议条款;⑤专用协议条款。对的是的优先解释次序是( )。

A.①-②-③-④-⑤

B.②-①-③-⑤-④

C.②-③-①-⑤-④

D.①-③-②-④-⑤

37.根据《原则施工招标文献》(2023年版),承包人的义务应包括( )。

A.发出动工告知

B.设计临时设施

C.组织竣工验收

D.进行设计交底

38.有关货品采购协议中违约责任的说法,对的是( )。

- 供货人提前交货无需承担购货人发生的代保管费
- B.购货人中途退货应承担由此导致供货人发生的费用
- C.因包装不符合规定导致货品损坏的，供货人无需支付违约金
- D.自提货品购货人按约提货未提到的应自行承担发生的费用


39.FIDIC 协议条件下，承包商可以同步索赔工期、成本和利润的状况是( )。

- A.业主终止协议
- B.现场发既有价值的文物
- C.出现不利的现场条件
- D.工程师指令错误

40.业主向承包商索赔，在确定误期赔偿费的费率时一般不考虑( )。

- A.征询工程师的盈利损失
- B.误期引起的贷款利息增长
- C.业主的盈利损失
- D.误期引起的监理费用增长

41.某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有( )条。

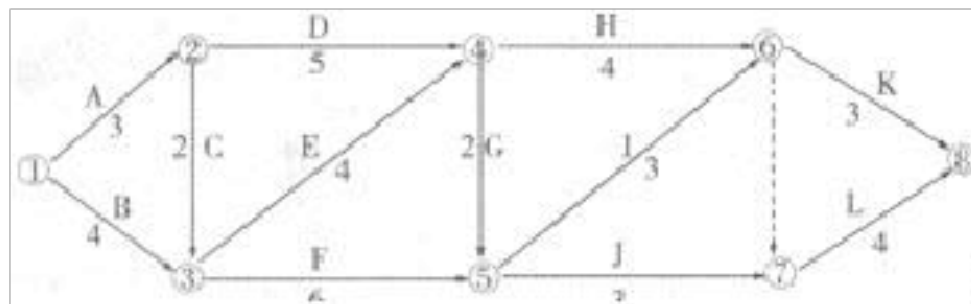

- A.2
- B.3
- C.4

42.有关双代号时标网络计划的说法，错误的是( )。

- A.实箭线的水平投影长度表达该工作的持续时间
- B.波形线表达工作与其紧后工作之间的时间间隔
- C.时标网络计划宜按各项工作的最晚开始时间编制
- D.双代号时标网络计划以水平时间坐标为尺度进行绘制

43.编制工程项目费用计划就是将总费用根据( )分派到各工作单元上去。

- A.投资估算
- B.各项工作所需时间
- C.设计概算
- D.工作分解构造

44.工程项目铺底流动资金一般按流动资金的( )计算。

- A.10%
- B.20%
- C.30%
- D.40%

45.工程项目措施费中的二次搬运费是指因( )等特殊状况发生的二次搬运费用。

- A.材料数量大
- B.施工场地狭小
- C.在施工现场加工材料

现场文明施工规定

46.《建设工程工程量清单计价规范》(G850500--2023),将环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费合并称为( )。

- A.环境文明施工费
- B.环境保护安全施工费
- C.环境保护、安全文明施工费
- D.安全文明施工费

47.在工程项目投资建设各阶段中,资源消耗量最大的是项目( )阶段。

- A.决策
- B.准备
- C.实行
- D.竣工

48.根据《建设工程工程量清单计价规范》(G850500--2023),清单项目单价中不包括( )。

- A.措施费、规费和税金
- B.企业管理费、规费和税金
- C.措施费、规费、利润和税金
- D.措施费、企业管理费、规费、利润和税金

49.工程项目费用计划的编制根据包括( )。

- A.工程决算
- B.费用估算

时间费用合计曲线

D.工程标底

50.某公共建筑物的直接工程费为 3500 万元，措施费为直接工程费的 5%，间接费为直接费的 10%，利润为直接费和间接费的 5%，税金按规定计取，税率取 3.41%，则该工程的建筑安装工程造价为( )万元。

51.某工程项目总费用预算为 1000 万元，计划工期为 10 个月，第 B 个月月末已竣工作实际费用为 900 万元。若此时预测项目能否按预算完毕，还需要( )信息。

- A.计划工作预算费用
- B.已竣工作预算费用
- C.已使用的准备金
- D.已消耗的资源数量

52.工程质量管理中的“三全控制”是指( )。

- A.全面质量控制、全过程质量控制和全员参与控制
- B.全面质量控制、全方位质量控制和全员参与控制
- C.全要素质量控制、全方位质量控制和全员参与控制
- D.全要素质量控制、全过程质量控制和全员参与控制

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/618103142045006111>
